


**Преглед стања радова на градилишту закључно са
13.07.2009.- деоница 28+000.00 до 38+000.00**

Почетак деонице
км 28 + 000,00

Крај деонице
км 38 + 000,00

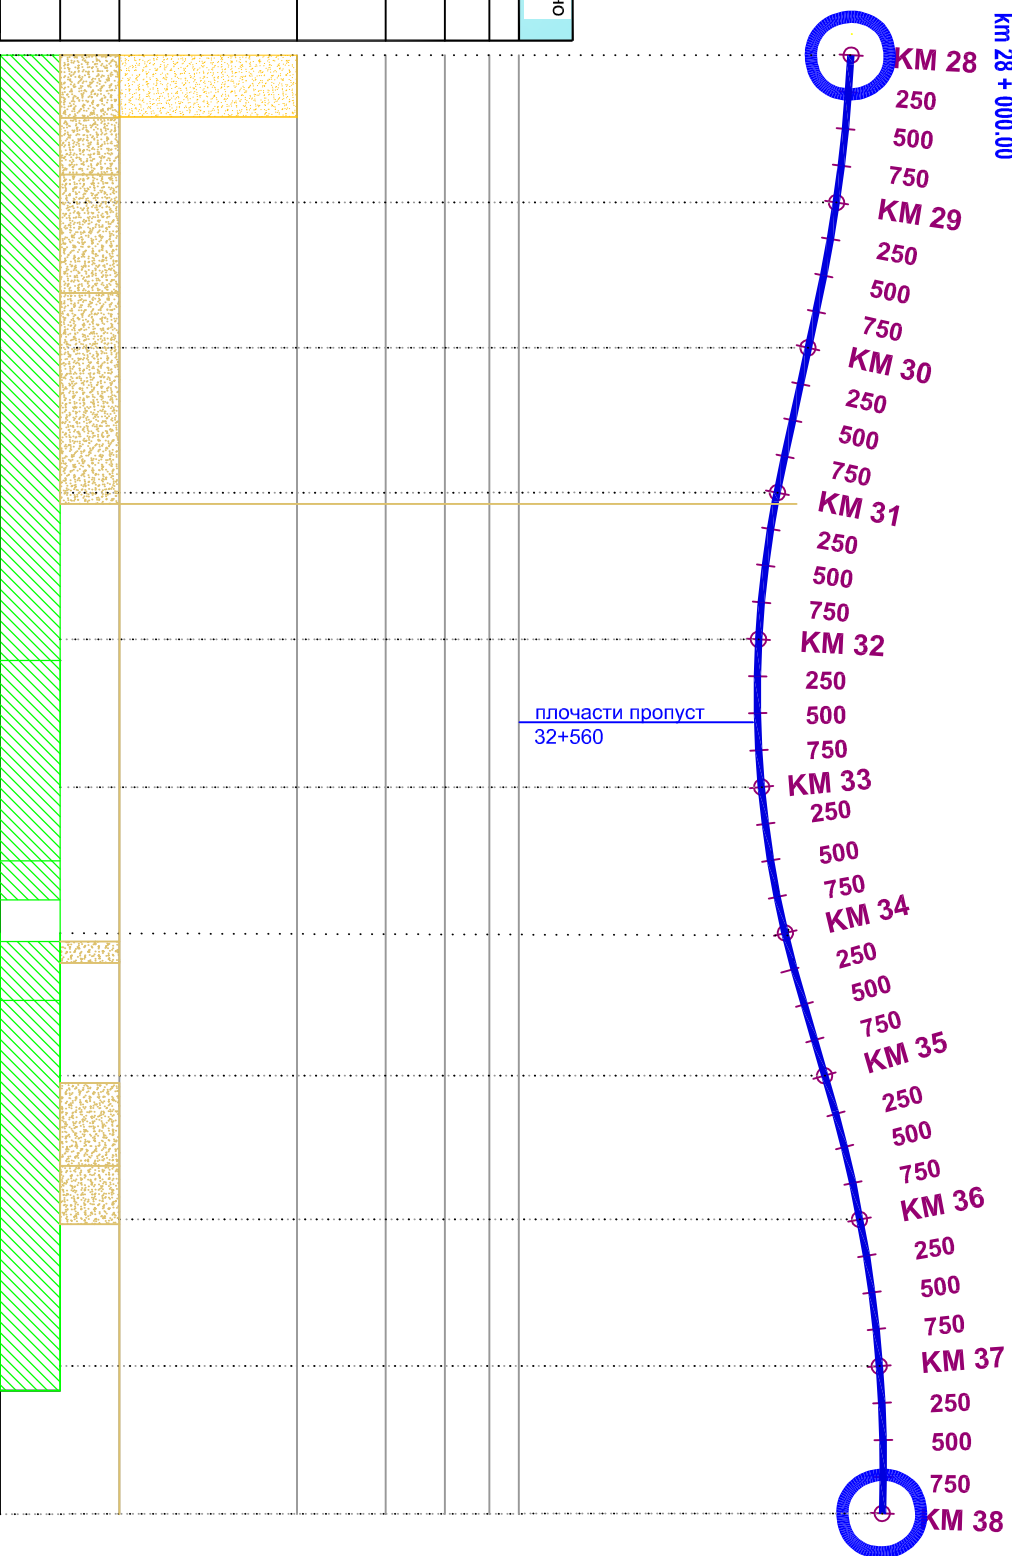

Позиција	Опис позиције	Утоворена количина	Извршено %
13060	Израда слоја Б1 22сд, д=7+8цм	108.890,82	-
13040	Израда слоја БНС 22сд, д=7+8цм	84.137,00	-
13030	Израда носећег слоја од кам. материјала 0/31	25.875,58	-
13020	Израда слоја постељице од кам. материјала, 0/63, д=30цм	37.628,57	-
13010	Израда насипа од песка д = 2*30 цм	109.658,47	0,78
12060	Израда насипа од материјала из позалишта	86.247,67	28,37
12010	Ископ хумуса	72.310,53	77,52
